

滋賀県立高等専門学校設置準備状況について

1 令和7年度における主な取組およびこれまでの進捗

(1) ソフト関係

ア 学校運営体制構築

(ア) 教員募集・選考

- 必要な教員数(専門科目・一般科目合計55人程度)の確保に向け、募集・選考を継続的に実施(令和8年3月2日時点で必要人数の約8割を内定)

(イ) 教育課程等検討

- 校長予定者のもと、開校準備教員7人(機械系1人、電気電子系1人、情報技術系2人、建設系1人、一般科目・学生支援2人)を中心に、①学校名・学科名・コース名、②建学の精神、基本理念、③教育の特色、④養成する人材像、⑤ポリシー、カリキュラムの概要、⑥授業科目の配置計画、⑦入試制度等を検討・整理(詳細別添資料5-2参照)

(ウ) その他学校運営に係る各種ルール、例規等検討

- 学則、学内体制、学内委員会、学生支援体制、課外活動、学生寮、食堂運営方法等の検討

(エ) 設置認可申請書作成

- (ア)～(ウ)の検討内容を盛り込んだ設置認可申請書作成に着手

イ 企業等との連携・共創

(ア) 県立高専への応援団づくり

- 「県立高専共創フォーラム」への参画を継続募集し、参画企業等数が400を突破

(令和8年3月2日時点)

区分	企業	団体	高専	行政	大学	個人	計
令和7年度新規参画者数	47	3	0	0	0	5	55
累計参画者数	270	20	2	1	4	119	416


- 企業関係者に、メールマガジンにより設置準備状況等の情報を継続的に共有(令和7年度8回、累計18回発行(令和8年3月2日時点))

(イ) 連携・共創の具体的なメニューづくり

- 参画企業へ個別訪問し、意見交換を継続的に実施(令和7年度28社、累計100社と面会)
- 令和7年12月3日、「共創インターンシップ」説明会(※)を開催(122社が参加)
 (※)インターンシップの実施を予定している場合に認可申請上必要となる実習受入企業の承諾を得るために実施した企業向け説明会
- 「共創インターンシップ」受入れ企業を募集(99社が受入れ意向(令和8年3月2日時点))



「共創インターンシップ」説明会 会場の様子

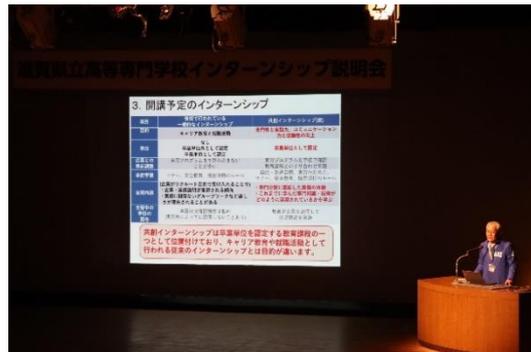

「共創インターンシップ」説明会 説明の様子

ウ 広報・周知活動

(ア) 専用ホームページ、ブログによる継続的情報発信



(イ) 広報資材 (チラシ、ポスター、ペン立てキット、ミニのぼり) の継続的配布

(ウ) 主催イベント、各種イベントへのブース出展、出前授業、地域での体験講座の継続的実施



(エ) 各メディアによる取材対応・記事掲載

- 令和7年10月 日刊工業新聞 記事掲載
- 令和7年11月 日本経済新聞 記事掲載
- 令和7年12月 日刊建設工業新聞 記事掲載



←令和7年10月2日
日刊工業新聞

令和7年11月26日→
日本経済新聞
高専特別版2025



(オ) 「教育しが」(県教育委員会発行)への連載記事掲載(10月:ハード面、1月:ソフト面)

(カ) 県内市町教育委員会への訪問・説明、市町校長会での説明

⇒ 志願者獲得に向けて、上記広報・周知活動を展開し、県立高専設置の認知度が向上
【県内認知度(LINE アンケート結果)】

令和5年度 57.3% → 令和6年度 64.2% → 令和7年度 68.5%
+6.9% +4.3%

(2) ハード関係

ア 用地整備、周辺インフラ整備

- ・ 用地整備（盛土造成、雨水排水設備整備、歩道整備、防犯灯設置）を実施（令和8年3月までに完了予定）
- ・ 上下水道管（野洲市施工）、電線（関西電力送配電株施工）の各敷設を実施・完了
- ・ ガス管（大阪ガスネットワーク株施工）のうち用地への引込み管の敷設を実施・完了（本管延伸工事は令和8年度施工予定）



【用地の状況（令和8年2月4日時点）】

イ 校舎等施設整備

- ・ 令和7年6月 基本設計段階での校舎等施設概要を公表
- ・ 令和8年1月 実施設計（株東畑建築事務所）を完了
- ・ 令和8年2月～ 建設工事（3工区×3工種）発注に向けた入札公告を順次開始



【県立高専キャンパス全景イメージ】

2 今後の主な予定

(1) 設置認可申請関係

- ・ 令和8年4～5月 学生確保の見通し調査（中学生・企業向けアンケート）を実施
※ 設置認可申請に必要な手続の一つとして、県立高専への中学生の入学意向および企業への人材需要を調査し、実数で入学定員（120人）を超えるニーズがあることを確認
- ・ 令和8年10月 文部科学省へ設置認可申請書を提出

(2) 校舎等施設整備関係

- ・ 令和8年4月～ 工区・工種ごとに、順次契約手続
- ・ 令和8年5月～ 校舎棟の建設工事を開始（令和9年11月頃完了予定）
- ・ 令和8年8月～ 校舎棟以外の建設工事を開始（令和9年11月頃完了予定）

（以上）
