

県営金亀公園（(仮称)彦根総合運動公園）整備事業について

県営金亀公園（(仮称)彦根総合運動公園）は、2024 年開催の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会での活用はもとより、将来のスポーツ振興やスポーツを通じた健康増進、地域の活性化のための施設として整備を進める。

1 用地取得状況について

彦根市の協力もあり、公園東側の第 3 種陸上競技場整備のための事業用地に加えて、公園西側の第 1 種陸上競技場整備のための事業用地も取得の目処が立ち、来年度中の整備工事の着工が可能となった。

なお、事業区域内の農業用の道路・水路等は、国から土地改良区へ無償譲与された開拓財産であるため、土地改良区から国に返還した後、県が国から払下げを受ける必要があり、今後必要な手続きを進める。

また、未取得の民有地については、地権者の方に一定のご理解をいただいているものの、代替地を必要とするもの等であり、引き続き彦根市と連携し、代替地の目処をつける等、地権者のご理解を得て早期に取得できるように取り組む。

用地取得の状況

(平成 31 年 1 月末現在 個人所有地の状況)

区分	取得済み	拡張部全体
取得面積	5.6 h a (91.8%)	6.1 h a

2 平成 30 年度（2018 年度）の主な事業内容について

(用地買収)

- ・用地取得

(工事)

- ・彦根総合運動場建築物解体工事
- ・彦根市民体育センター解体工事
- ・彦根総合運動場土木施設撤去工事（2018 年度～2019 年度）

(調査設計)

- ・第 1 種陸上競技場実施設計
- ・連絡橋にかかる調査・予備設計
- ・民間活力導入調査

3 平成31年度（2019年度）の主な事業予定について

（用地買収）

- ・用地取得（開拓財産払下げ等）


（工事）

- ・土木施設撤去工事（2018年度～2019年度）
既存施設（舗装版、擁壁、水路など）の取壊し撤去
- ・公園等整備工事（2019年度～2020年度）
東側拡張部の地盤対策および基盤整備
- ・連絡橋整備工事（2019年度～2020年度）
下部工・上部工
- ・第1種陸上競技場新築工事（2019年度～2022年度）
第1種陸上競技場の建築

（調査設計）

- ・連絡橋実施設計
- ・民間活力導入調査

4 整備スケジュール

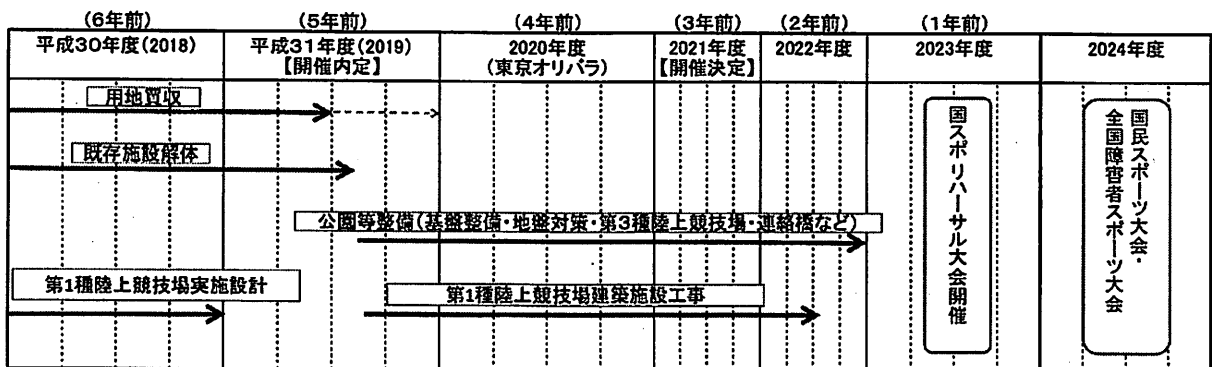

※ 現時点の想定であり、工事の実施状況により適宜見直す。



第1種陸上競技場 完成予想図
