

「うみのこ」再入札に向けた検討状況について

1 これまでの経緯

(1) 入札の状況

- ・入札物件名 びわ湖フローティングスクール新船建造工事
- ・納入期限 平成29年3月17日

平成27年7月1日 入札公告

平成27年8月9日 入札中止公告

(入札参加の前提となる競争参加資格の確認書類の提出を期日までに行った業者がなかったため。)

(2) 補正予算対応

- ・新船建造工事の入札不調により年度区分等を変更した。

○学習船建造費

(単位：千円)

	総額	平成27年度	平成28年度 (債務負担行為)	平成29年度 (債務負担行為)
変更前	3,200,000	1,088,194	2,111,806	0
変更後	3,200,000	0	1,920,000	1,280,000
変更額	0	△ 1,088,194	△ 191,806	1,280,000

○学習船建造監督費

(単位：千円)

	総額	平成27年度	平成28年度 (債務負担行為)	平成29年度 (債務負担行為)
変更前	15,000	6,000	9,000	0
変更後	15,000	0	9,000	6,000
変更額	0	△ 6,000	0	6,000

(3) チーム設置

- ・平成27年10月20日 学習船「うみのこ」新船建造プロジェクトチームの設置

別紙のとおり

(4) 再入札に向けた準備

- ・新船建造計画の積極的な周知と情報収集
近畿運輸局、現船運航委託業者、造船所、日本造船工業会、造船会社等を訪問調査
- ・プロジェクトチームによる再入札に向けて検討

2 今後の対応等

(1) 再入札について

- ・契約審査会において、契約方法や競争参加資格の設定等の審査を適切に行い、納入の期限を平成30年3月として再入札を行う。

< 補正後の予定 >

項目	補正後
建造工事公告	平成27年12月
入札、仮契約	平成28年1月
契約締結議案提案	2月
本契約締結	3月
詳細設計・建造工事	平成28年3月 ～平成30年3月
新船就航予定	平成30年4月

学習船「うみのこ」新船建造プロジェクトチームの設置について

1 目的

学習船「うみのこ」新船建造については、これまでから専門家や現場の教員・保護者等で構成する運営懇話会や庁内関係部局で構成する新船建造協議会などで多様な意見を聴き、円滑な事業推進に努めてきたが、さらなる執行体制の強化を図るため、教育委員会事務局内に新船建造プロジェクトチーム(以下、「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

2 所掌事務


- (1) 新船建造の推進に関すること。
- (2) その他円滑な新船就航に必要と認める事項に関すること。

※再入札に向けての課題の洗い出し、対応策の検討など

3 プロジェクトチームの体制

- (1) プロジェクトチームリーダーは、学校教育課主席参事(兼教育総務課企画室長)とする。
- (2) 土木交通部監理課から2名(技術管理室、審査契約係)の併任職員、教育総務課から2名(企画室、学校施設経理係)の兼務職員を加え、技術面・制度面での体制強化を図る。

<新船建造プロジェクトチーム>

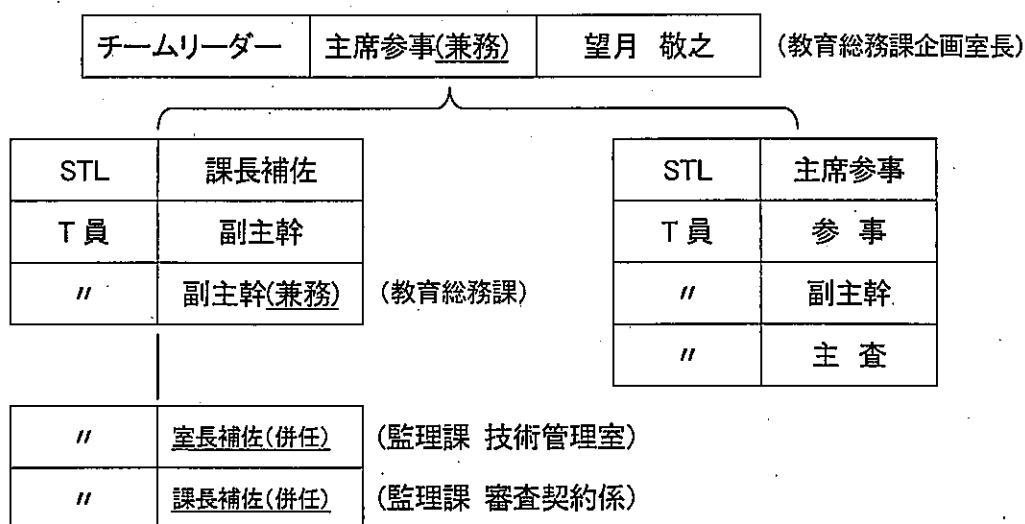

※必要に応じて他の部署からの参画を求める。

4 設置時期

平成27年10月20日に要綱により設置する。
