

契約の変更につき議決を求めることについて  
(旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事)

1. 工事名

平成25年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事

2. 工事場所

栗東市小野

3. 工事目的

本工事は次の支障を除去することを目的とする

- ・ 廃棄物の飛散流出のおそれ
- ・ 汚染された浸透水が地下水へ拡散するおそれ
- ・ 硫化水素ガスの悪臭発生のおそれ

4. 工事概要

廃棄物土掘削工、廃棄物土選別工、浸透水処理施設工

汚染地下水拡散防止対策工(鉛直遮水工、底面遮水工、浸透水揚水工、キャッピング工)

5. 工期

平成25年12月20日～平成33年3月25日

6. 変更による増減額

変更前契約額 4,568,878,440 円

変更増減額 89,627,040 円

変更後契約額 4,658,505,480 円

7. 契約相手方

鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体

代表者 株式会社 鴻池組 京都支店

支店長 岩口 弘

8. 変更理由

- ・ D工区東側の計画掘削ラインでの廃棄物土掘削が完了したが、掘削面に約9m程度の幅で粘性土(Kc3)層が確認できなかった。そこで調査を実施したところ、掘削法面の奥に粘性土(Kc3)層が確認できたため、全旋回オールケーシング工法による廃棄物土を掘削しコンクリートによる底面遮水工を行う必要が生じた。



図-1 位置図

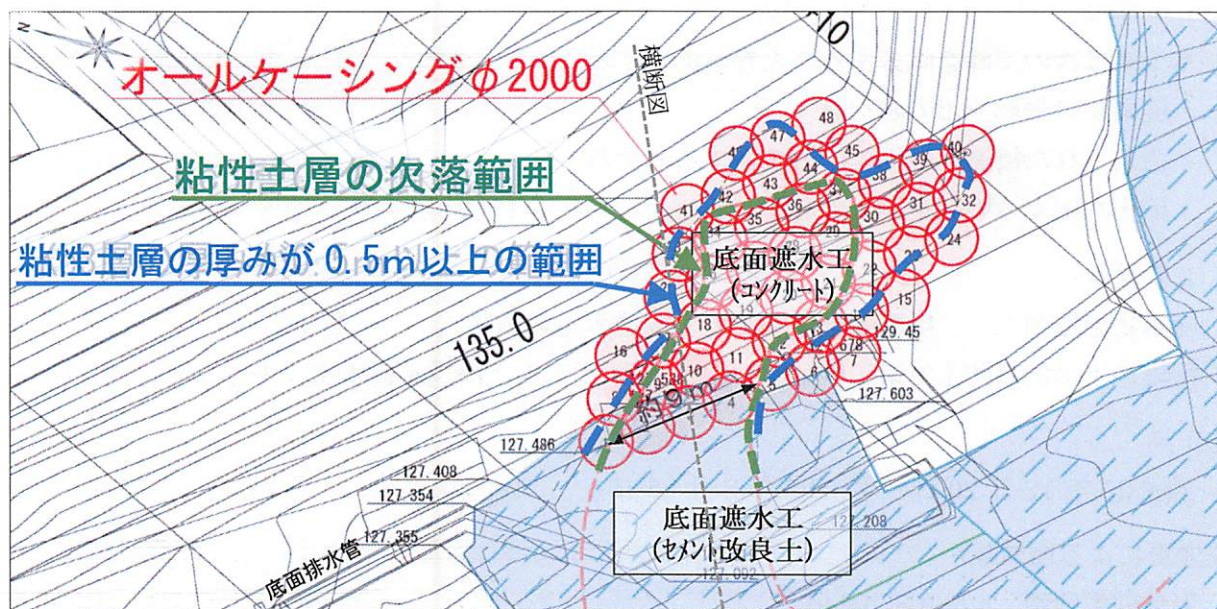


図-2 平面図

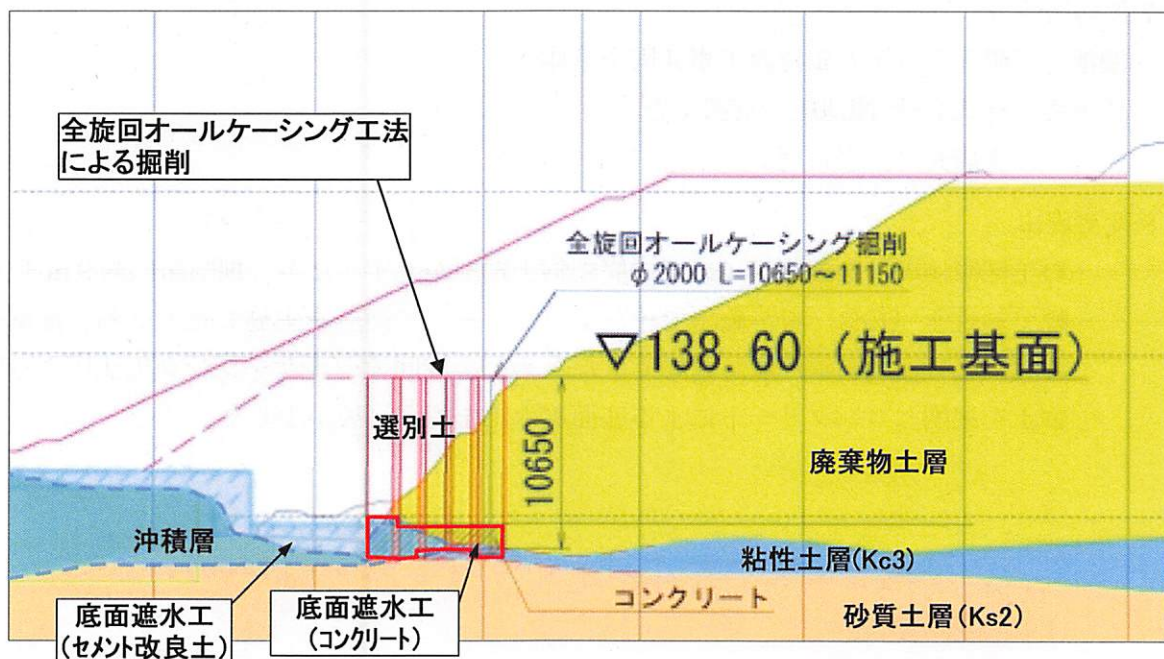


図-3 横断図
