

事故繰越説明書（県営農地防災事業 淡海地区）

◆工事概要

地区名：淡海地区

工事場所：高島市今津町深清水

工事内容：仮締切堤工、洪水吐工、取水設備工

工事価格：210,549,900 円

(H30 予算：136,636,197 円、R1 予算：13,162,600 円、R2 予算：60,751,103 円)

補助率：国 55%、県 34%、市 11%


◆事故の経過

- 淡海湖は約 270ha の排水流域を持つ、県内でも有数の大規模な農業用ため池。
- このため、大量の流入水を防ぐための仮締切堤を設置し、堤体盛土をドライな状態で施工できる環境を確保する必要がある。
- 上記仮締切堤が、令和元年 10 月の台風 19 号による豪雨（日累加雨量 87mm）により損壊する事故が発生し、工事を一時中断せざる得ない状況となった。


◆事故後の対応

- 被害の規模から平成 30 年度予算にかかる工事について、令和元年度中の完了が困難と判断されたことから、近畿農政局および近畿財務局と「令和 2 年度への繰越（事故繰越）」について協議。結果、予期しがたい想定以上の豪雨に起因するものと認定され、事故繰越手続きを実施したもの。（事故繰越額：27,703,000 円）
- 工事は 4 月に再開し、事故繰越分の工事については本年 10 月に完了する予定。

◆ 事故繰越工程表

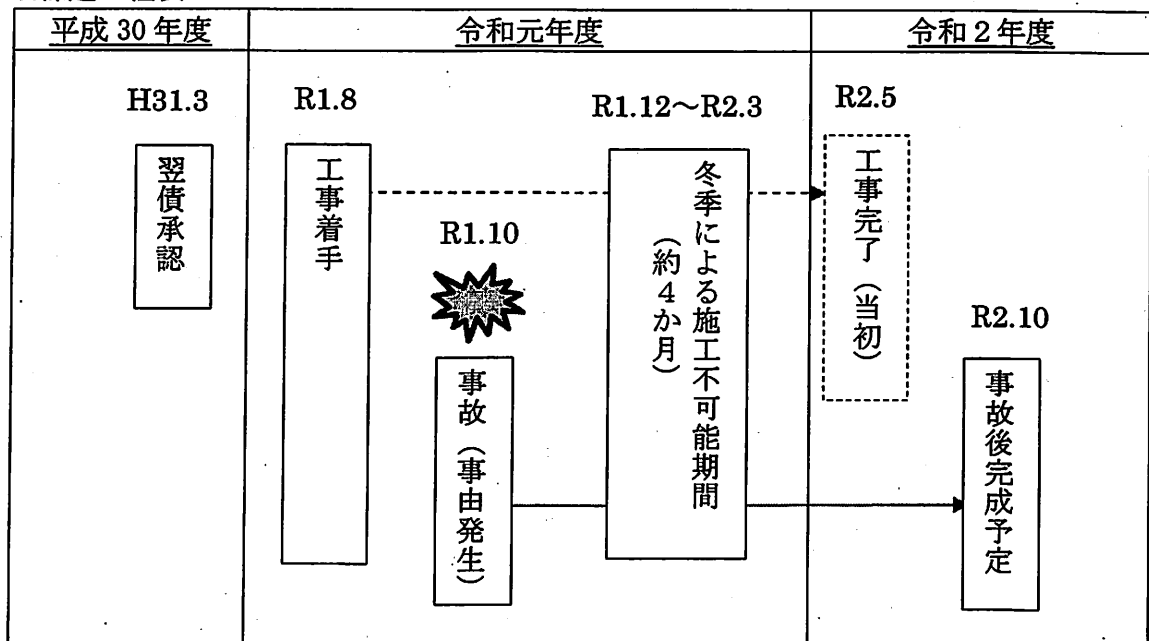

◆位置図

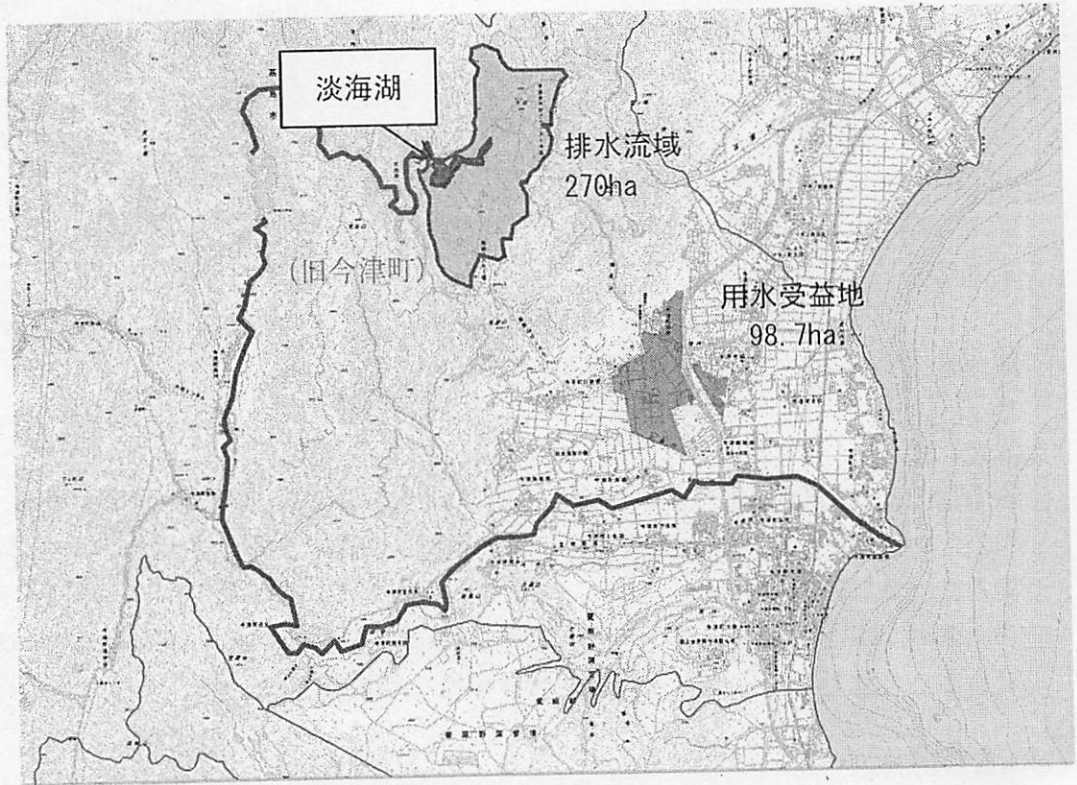

◆平面図

