


信楽窯業技術試験場新築工事の変更契約締結について

信楽窯業技術試験場新築工事については、令和2年12月から建築工事を開始しているが、本館予定地の地盤改良工事に着手したところ、大型の転石が多数確認されたことから、地盤改良の施工の障害となる転石を取り除くため、変更契約を締結し、撤去工事を実施する。


(変更契約の概要)

- | | |
|----------|---|
| 1 工事名 | 信楽窯業技術試験場新築工事 |
| 2 施工場所 | 甲賀市信楽町勅旨2200-5 他 |
| 3 変更理由 | 地中障害物撤去工事の追加 |
| 4 工期 | 変更前：令和2年12月1日～令和3年11月30日
変更後：令和2年12月1日～令和4年6月30日 |
| 5 契約金額 | 変更前：456,170,000円
変更後：545,116,000円 |
| 6 契約の相手方 | 高島市安曇川町西万木926番地
株式会社 桑原組
代表取締役 桑原 勝良 |

<工事箇所図>

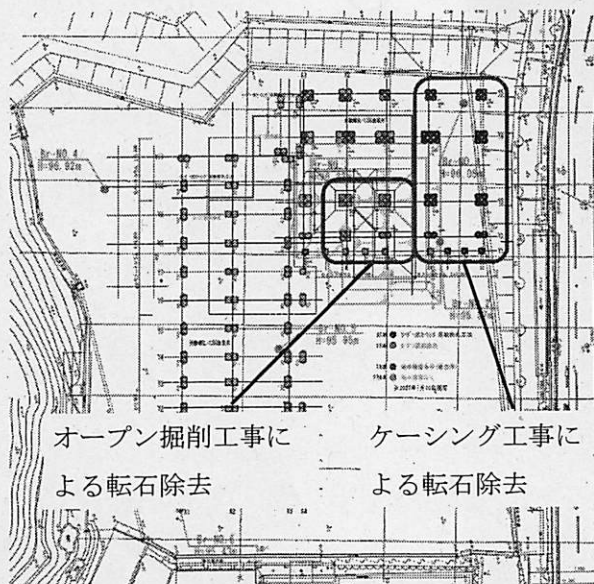

<該当箇所イメージ図>

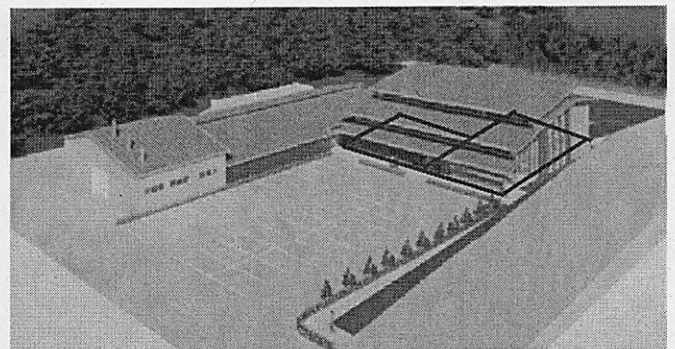

↑
陶芸の森

東側（国道307号線側）より
