

## 事故繰越説明書 (団体営農地耕作条件改善事業 野村1地区)

### ◆ 工事概要

地区名：野村1地区

工事場所：近江八幡市 野村町

工事内容：水田の区画拡大 A=8ha、暗渠排水A=17ha

- 区画拡大工事については、直営施工
- 暗渠排水工事については、請負発注で工事实施

工事価格：17,160千円 (国庫補助金 17,160千円)


### ◆ 事故の経過

- 本事業は、水田の区画拡大工事を行い、その後に暗渠排水工事を実施
- 事業実施主体は、農繁期が終わった後に農地の区画拡大工事に着手し、その後に実施する暗渠排水工事について工事請負契約を締結したが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が近隣府県に発せられる事態となった。
- そのため、事業実施主体から新型コロナウイルス感染症防止対策として、区画拡大工事にかかる作業従事者を削減した施工体制で実施する旨の報告があり、人員削減に伴う施工能率の低下により農地の区画拡大工事と暗渠排水工事の一部において年度内施工が困難となった。

### ◆ 事故後の対応

- 令和元年度予算に係る工事について、令和2年度中の完了が困難と判断し、近畿農政局および近畿財務局と協議した結果、やむを得ないものと認定され事故繰越手続きを実施したもの。(事故繰越額：11,877,000円)
- 工事は稲刈り後の令和3年10月に再開し、令和3年11月末の完了予定

### ◆ 事故繰越工程表

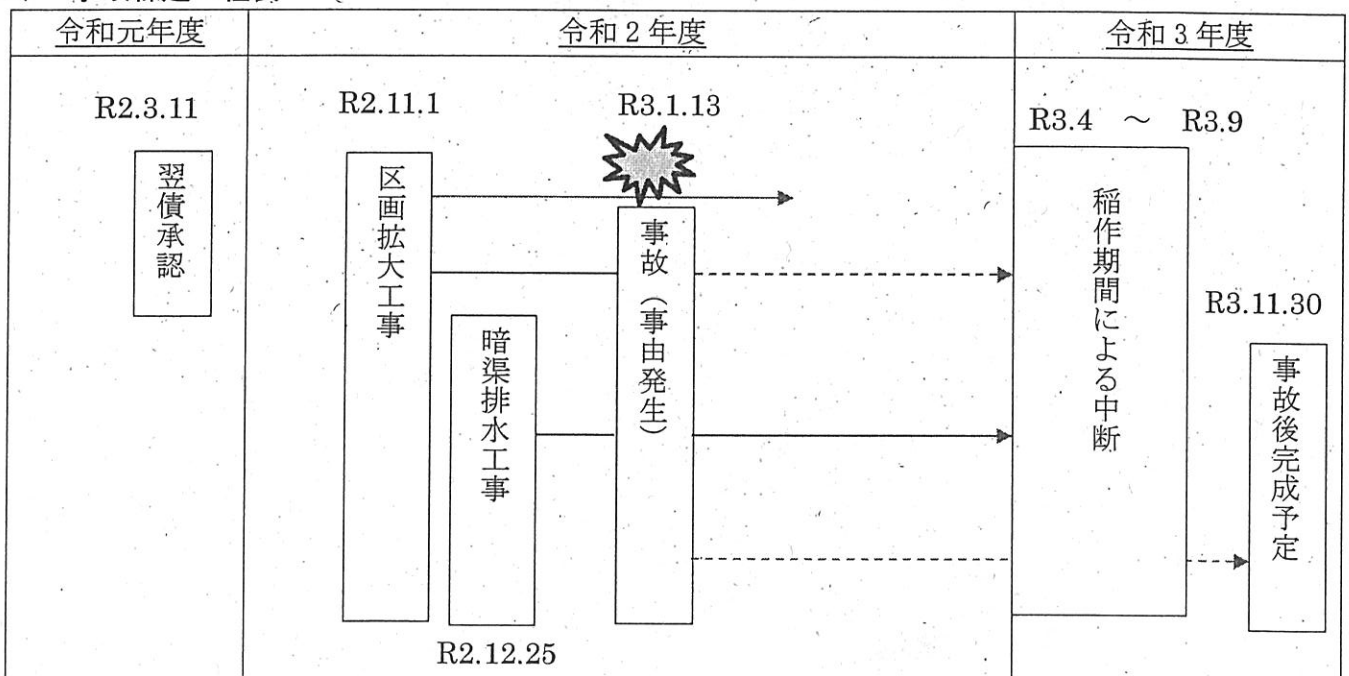

—————▶ 当初計画工程  
 - - - - -▶ 事故発生後工程

