環境・農水常任委員会資料１
平成 29 年(2017 年)3 月 9 日(木)
琵琶湖環境部最終処分場特別対策室

契約の変更につき議決を求めることについて
(旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事)

1.工事名　平成 25 年度第 RD-3 号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事

2.工事場所　栗東市小野

3.工事目的　本工事は次の支障を除去することを目的とする
・廃棄物の飛散流出のおそれ、汚染された浸透水が地下水へ拡散するおそれ、硫化水素ガスの悪臭発生のおそれ

4.工事概要
廃棄物土掘削工　、廃棄物土選別工　、浸透水処理施設工
汚染地下水拡散防止対策工(鉛直遮水工、底面遮水工、浸透水揚水工、キャッピング工)

5.工期　平成 25 年 12 月 20 日～平成 33 年 3 月 25 日

6.変更による増減額
166,516,560 円　(変更前契約額　3,388,598,280 円　変更後契約額　3,555,114,840 円)

7.契約相手方
鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体
代表者　株式会社 鴻池組　京都支店支店長　　岩口 弘

8.変更理由
工事着手後に受注者が実施したボーリング調査の結果から、DE 工区における底面粘性土層の欠如範囲がこれまでの調査結果による想定より広いことが確認されたため、DE 工区の底面遮水工の施工範囲が拡大し、これに伴う廃棄物土掘削工や選別土量等もそれぞれ増量変更する必要が生じた。
（予算については平成 28 年 2 月議会において債務負担行為 170,000 千円として議決済み）

○契約額の推移


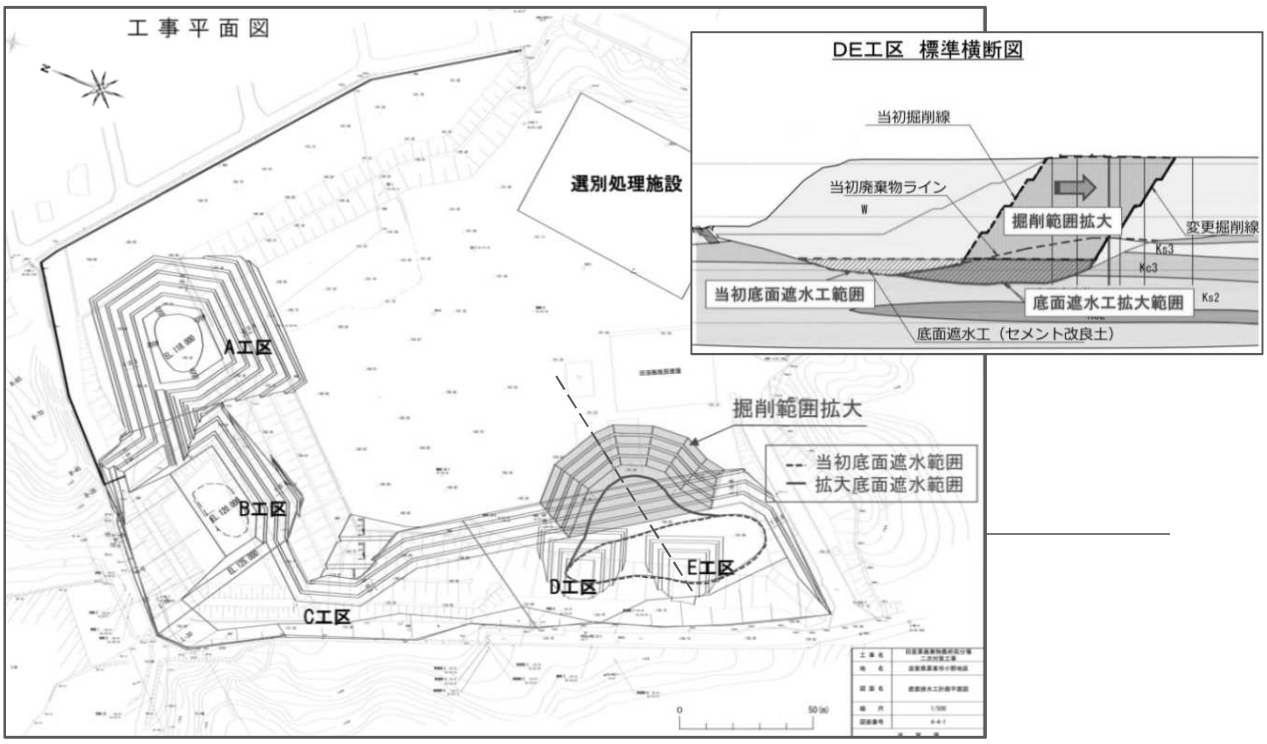
※【H26 予算内追加】0.50 億円(H27. 3 月)　【H27 予算内追加】0.18 億円(H27.12 月)　0.19 億円(H28.3 月)
【H28 予算内追加】0.31 億円(H28.8 月)　0.46 億円(H29.1 月)
